

社会資本総合整備計画 事後評価書 (案)

資料3-11

計画の名称	防災・安全に資する公園整備の推進(防災・安全)									
計画の期間	平成29年度～平成31年度 (3年間)	交付対象	神戸市							
計画の目標	自然災害の発生等を受けて、土砂災害等に対する街の防災性の向上を図り、誰もが安全で安心して利用できる快適な公園の実現を目指す。									
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>台風等により災害の発生した公園のうち、神戸市地域防災計画に基づき、広域防災拠点に指定されている都市公園の災害対策を行い、安全な広域防災拠点としての機能を確保する。</li> <li>安全な広域防災拠点としての機能を確保している公園の割合を増加する。</li> </ul>									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考	
						当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)		
①	(安全な広域防災拠点の割合) = (1 - (災害を受けた広域防災拠点の公園数/広域防災拠点の公園総数)) × 100					88%	88%	100%		
②										
全体事業費	合計 (A+B+C)	80百万円	A	80百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
令和2年度 神戸市建設事業外部評価委員会	2020/ /
	公表の方法
	神戸市ホームページに記載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31			
A-1	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	吸収源対策公園緑地事業	北神戸田園スポーツ公園における法面整備	神戸市						80		
小計												80				
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
小計																
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
小計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する  
 交付対象事業の効果の発現状況

・本整備により安全な広域防災拠点としての機能を確保できた。

II 定量的指標の達成状況

指標①：  
 安全な広域防災  
 拠点としての機  
 能を確保してい  
 る公園の割合

最終目標値

100%

目標値と実績値  
 に差が出た要因

・目標を達成した。

最終実績値

100%

指標②

最終目標値

目標値と実績値  
 に差が出た要因

最終実績値

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
 (必要に応じて記述)

・安全な広域防災拠点としての機能を確保した結果、緊急事態以外の通常利用においても公園の安全性を確保することができた。

3. 特記事項 (今後の方針等)

・市民が安全に、安心して公園を防災の拠点として活用できるよう、今回整備を実施した北神戸田園スポーツ公園をはじめとして、市内の公園の適切な維持管理を今後も継続的に行っていく。

# 社会資本総合整備計画

## 神戸市建設事業外部評価委員会 第一回説明会


防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

担当：建設局公園部計画課

1

はじめに

緑の基本計画について

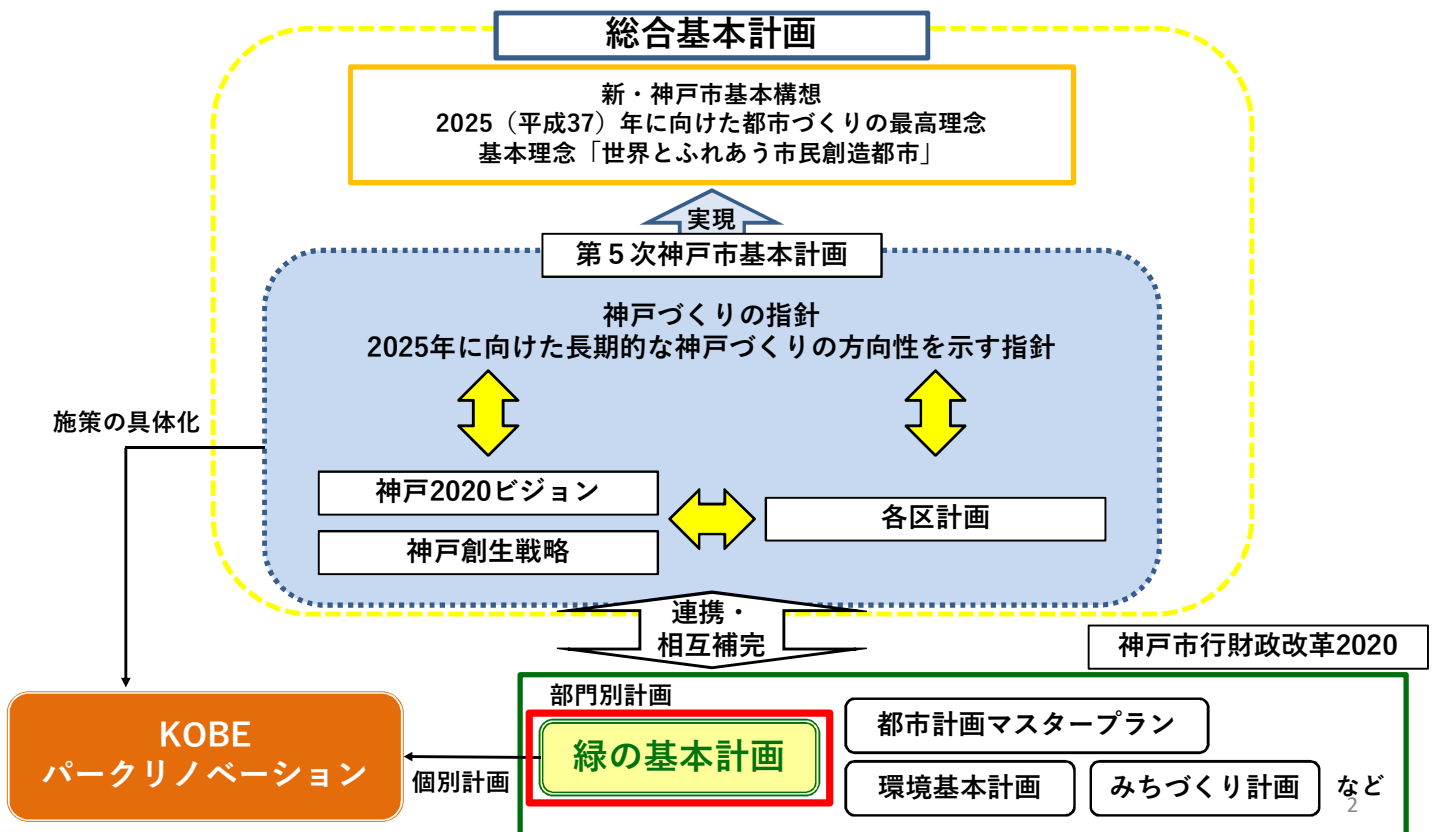

# はじめに

# 緑の基本計画について

## 緑の基本計画の構成

## 緑の基本計画の基本理念



○地域ごとの緑の特徴から神戸市を3つにゾーニングし、各ゾーンの特徴を生かした施策を展開

○3つのゾーンを有機的につなげることで、豊かな水と緑に包みこまれたまちをめざす。




みどり・まち・田園のゾーンを有機的につなぐ「水と緑のネットワーク」のイメージ



# はじめに

# 緑の基本計画について

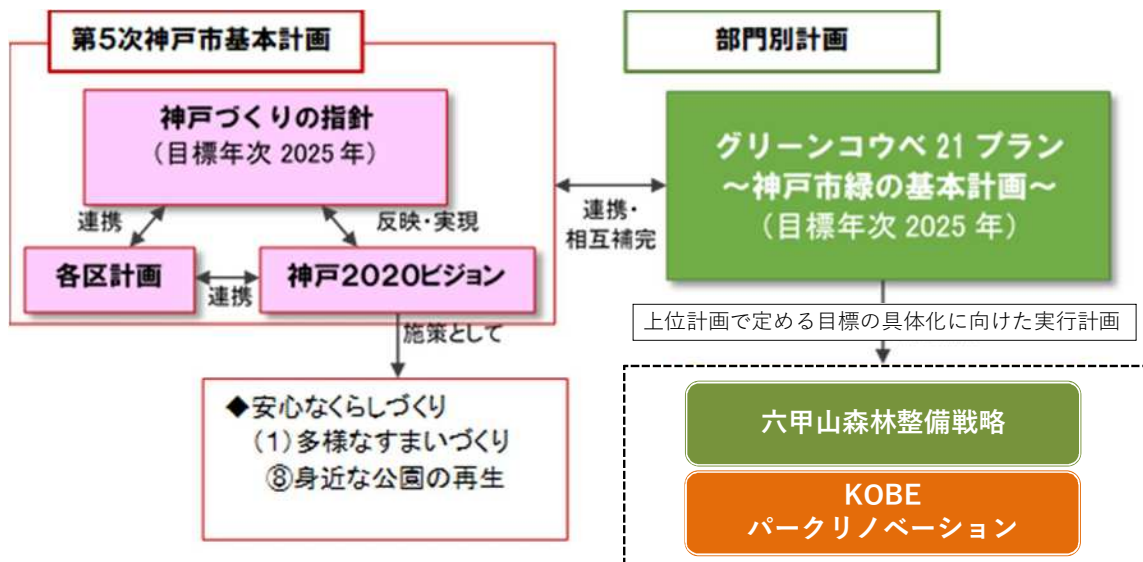

### 六甲山森林整備戦略

⇒ 森林整備の実施に向けた基本的な考え方

- ① 戦略的ゾーニングによる森林整備の推進
- ② 多様な主体との協働による森林の育成・活用

など

### KOBEパークリノベーション

⇒ 施策を力強く推進するモデル事業

- ① にぎわいのある公園づくり
- ② ストックを活用した公園づくり
- ③ 市民が主役の公園づくり

など

## 施策の展開と具体的な取り組み

## 対応する整備計画

みどりのゾーン

六甲山系や帝釈・丹生山系などの緑を保全・育成・活用し、市民のくらしや自然環境・美しい景観を守ります。

- 取り組み(1) 森林レクリエーション施設の充実
- 取り組み(2) みどりの聖域づくり
- 取り組み(3) 自然災害から人とまちを守る森づくり 等

まちのゾーン

魅力と活気あるまちづくりを進めるとともに、震災の教訓を活かした安全で快適なまちづくりを目指します。

- 取り組み(1) 時代のニーズに対応した公園施設等のリニューアルと適切な保全
- 取り組み(2) シンボルとなる公園の魅力向上
- 取り組み(3) 公園等の安全性の向上とバリアフリー化 等

田園のゾーン

農地・里山等における生物多様性に配慮した自然環境の保全・育成や、農村地域のコミュニティの活性化を図ります。

- 取り組み(1) 生物多様性シンボル拠点整備の推進
- 取り組み(2) 田園地域のコミュニティ拠点の整備促進 等

### 社会資本整備総合交付金

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 国家的関連事業の開催に対応した都市公園の整備 |
| 2 | 地域ニーズに即した都市公園ストックの再編   |
| 3 | 安全・安心や環境に配慮した公園整備等の推進  |

### 防災安全交付金

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 4 | 「安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）Ⅱ」      |
| 5 | 「長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）」 |
| 6 | 「防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）」     |

## 1. 整備計画の内容

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

### ○計画の名称

社会資本総合整備計画

「防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）」

### ○計画の期間

平成29年度～平成31年度（3年間）

### ○交付対象

神戸市



## 3. 各事業の概要

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

### 【A-1】吸収源対策公園緑地事業

事業者：神戸市

内 容：北神戸田園スポーツ公園における法面整備

事業実施期間：平成29年度～平成31年度

全体事業費：30百万円

9

## 3. 各事業の概要

### 吸収源対策公園緑地事業とは

#### 事業概要

「京都議定書目標達成計画（平成20年3月改定）」に基づく地球温暖化対策の一層の推進を図るため、温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地の整備又は公共公益施設の緑化を支援する。

#### 事業の要件

- ①一箇所あたりの事業対象面積が500㎡以上かつ、緑化率が80%以上であること
- ②原則、都市公園及び緑地として管理するもの
- ③以上の要件を満たし、合計5箇所以上（重点都市※における事業には適用しない）の公園及び緑地の整備・緑化を行う事業であること

※環境モデル都市等の地区計画の指定により、緑の保全・創出を積極的に行っている都市

10

### 3. 各事業の概要

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

- 公園：北神戸田園スポーツ公園
- 整備箇所：神戸市北区
- 工期：H29～H31
- 整備内容：平成29年10月の台風21号に伴う大雨により崩壊した法面の防護工および植生吹付工
- 対象面積：法面 約0.1ha
- 整備状況：法面の崩壊対策により、安全性が確保され、都市の防災性が向上した。



整備前



整備直後



現在 (R2.7)

### 4. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）


#### I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

- ・本整備により安全な広域防災拠点としての機能を確保できた。

#### II 定量的指標の達成状況

- ・北神戸田園スポーツ公園における法面防災対策の完了をもって広域防災拠点となる9公園で安全を確保することができた。

当初：88%(8/9公園)  
⇒変更：100% (9/9公園)

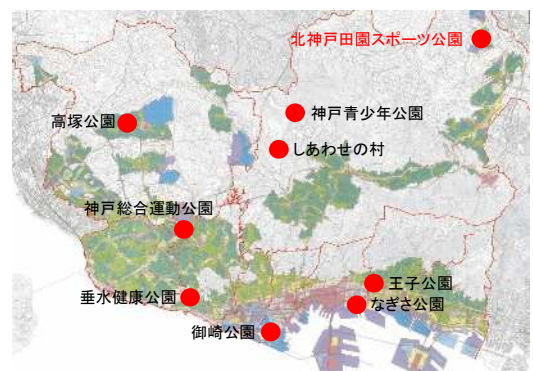



## 4. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

### Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 安全な広域防災拠点としての機能を確保した結果、緊急事態以外の通常利用においても公園の安全性を確保することができた。

北神戸田園スポーツ公園（体育館）



北神戸田園スポーツ公園（サブ球場）



13

## 5. 特記事項（今後の方針等）

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

- ・ 市民が安全に、安心して公園を防災の拠点として活用できるように、今回整備を実施した北神戸田園スポーツ公園をはじめとして、市内の公園の適切な維持管理を今後も継続的に行っていく。

14
